

MAREC

MOL z Gradisom skupino G, Energoplanom in Merkurjem sklene pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo. Občina naj bi v projekt vložila zemljišče, zasebni partner pa 81 milijonov evrov, s katerimi bi zgradil objekte. Merkur kmalu izstopi iz projekta, Gradis G in Energoplan ustanovita Grep.

MAREC

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se gradnja začne, čeprav Delta Grepu ne plača drugega obroka v vrednosti 20 milijonov evrov.

APRIL

Delta ne dobi kredita za financiranje projekta in hoče zmanjšati center ter upočasniti gradnjo, Grep, ki mora po pogodbi o JZP objekte zgraditi do 30. junija 2010, v to ne privoli.

JULIJ

Ministrstvo za šport na razpisu nogometnemu stadionu dodeli 9 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. Kasneje od občine zahtevajo vračilo dveh milijonov, zaradi česar sta MOL in MIZŠ še danes na sodišču.

Ob skoraj dokončanih dvorani in stadionu ter napol dokončanem trgovskem centru konzorcij bank po večmesečnih pogajanjih Grepu odobri sindicirano posojilo v znesku 115 milijonov (35 milijonov manj, kot je hotel Grep).



JESENI

Pogajanja o novem premostitvenem kreditu konzorcija bank Grepu se izjalovijo. Grep ne odplačuje starega posojila, obresti rastejo.

MAREC

Občina unovči bančni garanciji pri NLB in Factor banki v skupni vrednosti milijona evrov skladno s pogodbo za projekt Stožice.

ZAČETEK LETA

Terjatve bank do Grepa so prenesene na DUTB.

OKTOBER

Vodstvo Grepa vloži predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave. Grep upnikom dolguje 180 milijonov evrov, večino bankam.



MAREC

Izet Rastoder od Gorenjske banke in SID banke kupi terjatve do Grepa.

MAJ

DUTB podpiše pogodbo o prodaji terjatev.

2008

AVGUST

Grep in Delta podpišeta prodajno pogodbo za trgovski center Stožice. Delta naj bi za dokončan center plačala 242,5 milijona evrov, kasneje vrednost znižajo na 221 milijonov.



2009

JUNIJ

Kot novi investitor se predstavi avstrijska Supernova, a ta skupaj s projektno družbo MTK namesto Deltinih dobrih vrednosti vložijo le 5 milijonov, s katerimi dokapitalizira Grep. Gradnja objektov se nadaljuje.

2010

AVGUST

Odprtje športne dvorane in stadiona.

SEPTEMBER

MOL pripravi poročilo, iz katerega je razvidno, da bodo morali za dodatna dela plačati še 39 milijonov evrov.

NOVEMBER

Grep dobi prvi obrok posojila, porabi ga za poplačilo starih kreditov in dolgov do izvajalcev. Do konca leta Grep počrpa sto milijonov evrov kredita, zadnji obrok, 15 milijonov, ni nikoli izplačan, ker jim ne uspe pridobiti dodatnih sredstev.


2011

2012

2013

MAJ

Grep izgubi tožbo proti Delti, s katero je od srbske družbe zahteval plačilo 20 milijonov evrov pogodbene kazni.

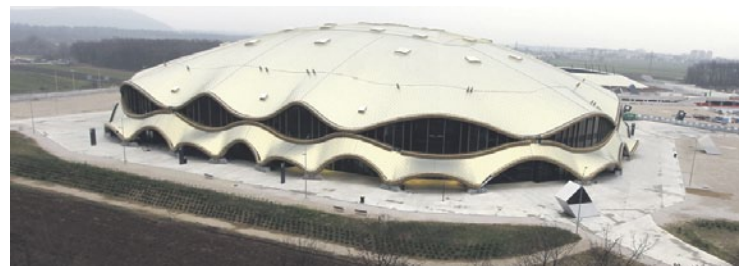

2014

2015

AVGUST

Pojavijo se informacije, da se za Stožice zanima Izet Rastoder. Takratni direktor DUTB Torbjörn Månsson napove, da bodo rešitev za Stožice našli še to leto.

2016
